

## 6. 短期計画(対象橋梁ごとの概ねの点検・修繕時期)

### 6.1 短期計画の位置づけ(性質)

対象橋梁ごとの概ねの点検・修繕時期について、短期計画として取りまとめる。

表 6-1. 各計画の対象期間及び位置づけ(性質)

| 計画区分  | 期間   | 位置づけ(性質)   |
|-------|------|--|
| 短期計画  | 10年間 | 定期点検から判定した健全性等の実態から、優先順位を踏まえて措置を行うために <b>運用する計画</b><br>※点検結果や修繕の進捗状況を踏まえて都度見直す必要がある。   |
| 中長期計画 | 50年間 | 劣化予測等から推計されるライフサイクルコストの <b>大枠的な傾向</b> (例: 評価期間中の費用の総額や集中時期等)や <b>効果</b> (例: 計画に基づく管理を行う場合のコスト縮減額)等の <b>見通しを把握・評価する計画</b><br>※管理数量や対象橋梁の諸元、基本方針の変更が生じた場合には見直すことが望ましい。 |

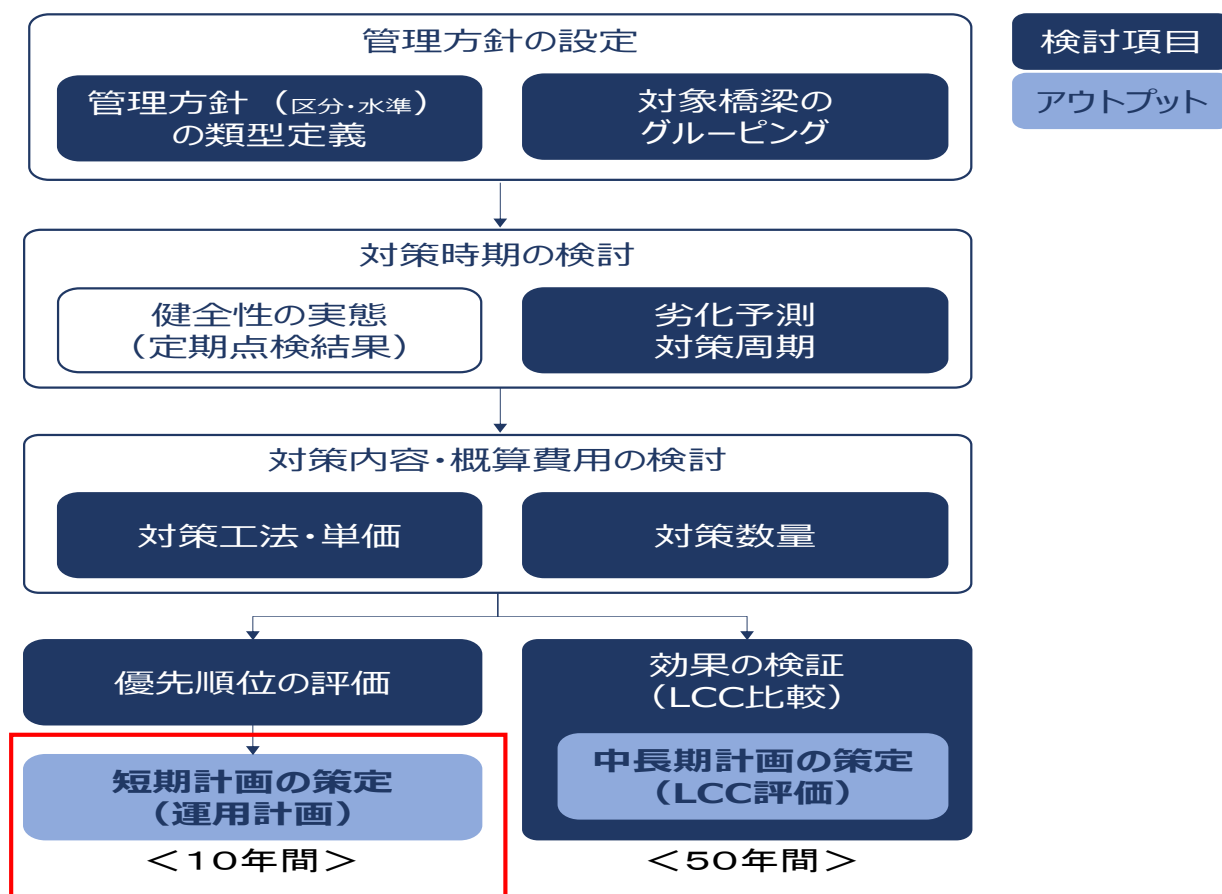


図 6-1. 長寿命化修繕計画策定フロー

## 6.2 10年間の短期計画

### 6.2.1 10年間の短期計画の作成方針

直近の定期点検結果を基に、10年間（2021年～2030年）の短期計画を作成する。

短期計画の作成にあたっては、中長期計画で選定したシナリオ（管理方針等）の考え方をもとに、限られた予算のなかで円滑に修繕等を実施していくため、修繕時期のばらつきや費用の年間予算額の超過が見られる場合については、対策の優先順位の考え方に応じて修繕時期を調整（先送り・前倒し）することで、費用を平準化する。

また、短期計画における対策の対象橋梁は、他事業との整合（連携）も図ることとする。特に、耐震補強事業については、国が優先的に進めている緊急輸送路上の橋梁の耐震化やロッキング橋脚を有する橋梁の耐震化、安全な市街地環境を確保するための都市計画道路の耐震化について優先する。

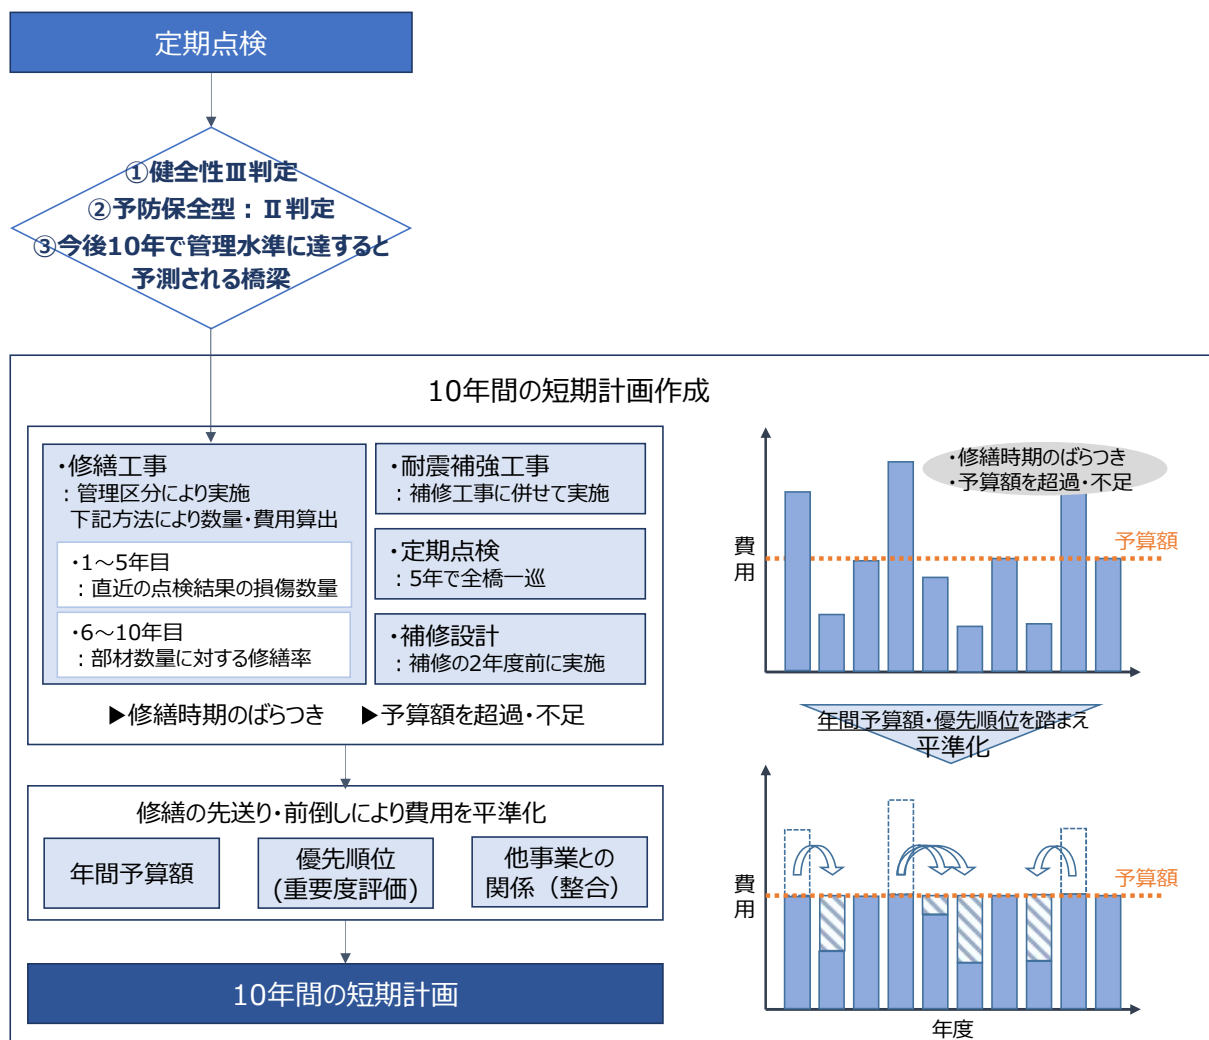


図 6-2. 短期計画作成フロー

## 6.2.2 年間予算額

橋梁の維持管理費用の平準化の目安として、過年度の維持管理の予算額より、年間事業費（予算額）の平均を算出する。過去 5 年間の予算額の平均から、年間の橋梁維持管理費用の予算額を 310 百万円／年と設定することとする。

表 6-2. 維持管理費用実績（予算額）（百万円／年）

| 年度     | 役務費 | 定期点検 | 設計・調査 | 工事請負費 | 工事請負費<br>（維持工事<br>（単価契約<br>等）） | 予算総額             |
|--------|-----|------|-------|-------|--------------------------------|------------------|
| H27    | 5.0 | 10.0 | 63.5  | 320.1 | 20.0                           | 418.5            |
| H28    | 6.0 | 15.0 | 35.0  | 136.3 | 20.0                           | 212.3            |
| H29    | 0.5 | 15.0 | 40.0  | 163.7 | 20.0                           | 239.2            |
| H30    | 0.0 | 16.3 | 63.9  | 237.4 | 20.0                           | 337.6            |
| H31/R1 | 0.0 | 13.9 | 37.4  | 266.3 | 20.0                           | 337.6            |
| 平均     | 2.3 | 14.0 | 48.0  | 224.7 | 20.0                           | <b>310 百万円／年</b> |

（資料：平成 27 年度～令和元年度 多摩市 橋りょう維持管理経費一覧）

### 6.3 対象橋梁毎の概ねの点検・修繕時期

10年間（2021年～2030年）の短期計画を示す。

これは、計画運用の実行性等の観点から、年間予算額や他事業との整合を踏まえて、優先順位により予算の平準化を行ったものである。

表 6-3. 10年間の維持管理費用内訳（億円）

|       | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 工事数   | 2橋           | 3橋           | 4橋           | 6橋           | 7橋           | 7橋           | 9橋           | 9橋            | 9橋            | 9橋            |
| 補修・架替 | 0.75         | 1.07         | 0.99         | 1.47         | 1.59         | 1.36         | 1.39         | 1.54          | 0.78          | 1.38          |
| 耐震補強  | 0.98         | 0.83         | 0.83         | 0.90         | 0.80         | 0.80         | 0.50         | 0.38          | 1.17          | 0.56          |
| 設計    | 0.07         | 0.41         | 0.32         | 0.31         | 0.31         | 0.35         | 0.28         | 0.19          | 0.10          | 0.09          |
| 定期点検  | 0.17         | 0.20         | 0.15         | 0.16         | 0.13         | 0.30         | 0.44         | 0.30          | 0.26          | 0.24          |
| 維持工事  | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 0.20          | 0.20          | 0.20          |
| 総額    | 2.17         | 2.71         | 2.49         | 3.03         | 3.03         | 3.02         | 2.80         | 2.61          | 2.52          | 2.47          |

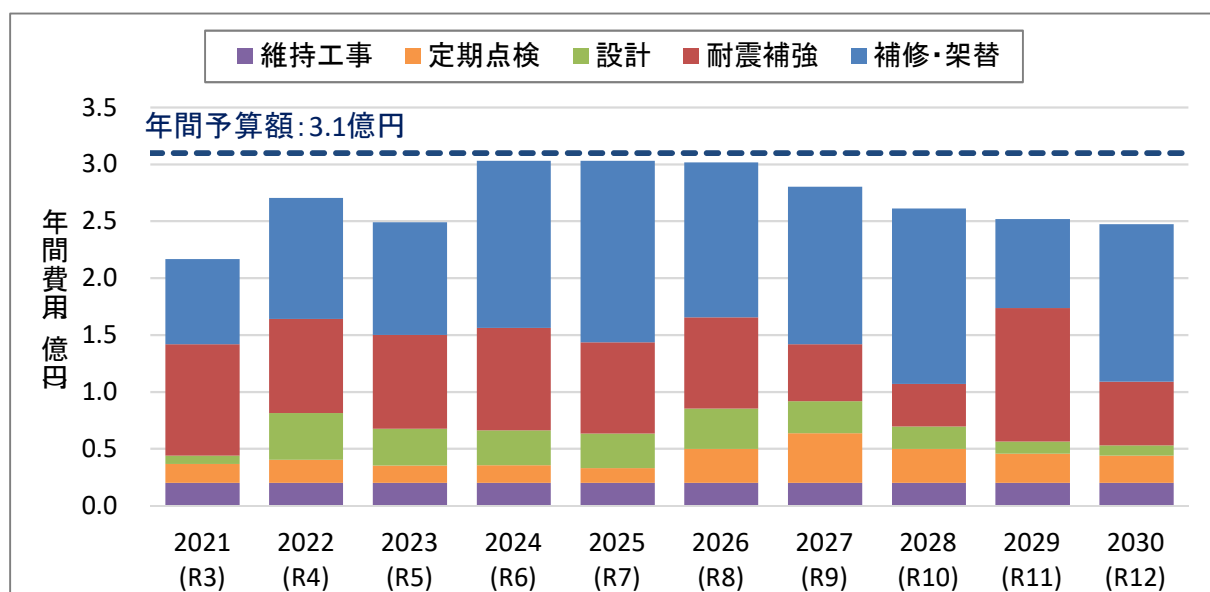


図 6-3. 10年間の維持管理費用内訳

上記の短期計画に対する認識、並びに計画詳細（対象橋梁毎の概ねの点検・修繕等の時期等（一覧表））について、次頁以降に示す。

### 【本短期計画に対する認識】

短期計画は、現状で扱えるデータや最新の事例等を踏まえた考え方のもと、当該計画を運用することで、必要な対策を計画的かつ着実に推進していくことを目的とするものである。ただし、予算制約等の与条件から、当該期間中に必要となりうる対策（平準化前）の一部を、当該期間以降に移行するものとしている。

これらの点を含む短期計画の性質については、次のとおり捉えながら、引き続き財源の確保、並びに優先順位に基づく順次対策の進捗に努めるものとする。

（本計画の基本方針等に基づくコスト縮減効果の発現）

- ✓ 本計画の基本方針に基づく管理の推進により、維持工事（単価契約等）による劣化進行の抑制や、包括的な委託による効率化（例：定期点検と補修設計の連携等）などの観点から、計画値よりコストの縮減が図られる体制となっていくことが期待できる。

（必要経費の試算精度について）

- ✓ 平準化前の短期計画期間中に計上される費用の一部は、劣化の予測等による対策時期の推定に基づき試算しており、後述の従来の健全性診断の精度の観点も含めて、経費は安全側に試算されやすい側面もある。
  - 短期計画によらず、算出費用は、ライフサイクルコストを評価する目的から各種仮定した条件のもと試算された概算値である側面もあり、必ずしも現実の予算要求に必要な金額と一致するものではない。
- ✓ 直近の定期点検結果においては、一部、準拠した点検要領の当初の考え方から、健全性の診断精度は必ずしも十分なものではなく、本計画の基本方針に基づき、今後の定期点検を通じて健全性の診断精度の向上を図ることで、措置が必要な橋梁が絞られる可能性がある。
- ✓ 定期点検や対策の履歴等のデータを蓄積することで、計画の策定方法（ライフサイクルコストの評価方法含む）やその精度を改善していく必要がある。
  - 計画の運用がある程度進捗した段階で、対策の実績等を含む蓄積データをもとに、中長期的な費用対効果（コスト縮減効果）についても見直していく必要がある。

（劣化の進行性について）

- ✓ 管理水準や劣化予測等から、対策が必要になると見込まれる時期について、当該時期を先送りする場合、多摩市の環境条件等から急激に劣化が進行することも考えにくいですが、日常管理や定期点検等によって、経過観察を徹底することが重要である。

（予算の柔軟な執行について）

- ✓ 不測の損傷発生や劣化進行等に対しては、維持工事（単価契約等）による措置のための予算枠も柔軟に運用することにより、応急的な措置も含めて必要な対応を迅速に行うことで、利用者や第三者の安全性を確保する。

表 6-4. 短期計画事業一覧 (1/6)

| No. | 橋梁名           | 路線名         | 架設年  | 橋長<br>(m) | 全幅員<br>(m) | 構造形式           | 点検結果 |     | 2021 (R3) 年度 |             | 2022 (R4) 年度 |        | 2023 (R5) 年度 |        | 2024 (R6) 年度 |        | 2025 (R7) 年度 |        |       |     |
|-----|---------------|-------------|------|-----------|------------|----------------|------|-----|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------|-----|
|     |               |             |      |           |            |                | 実施時期 | 健全性 | 216,939千円    |             | 270,611千円    |        | 249,338千円    |        | 303,296千円    |        | 303,166千円    |        |       |     |
|     |               |             |      |           |            |                |      |     | 主な対策内容       | 費用(千円)      | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円) |       |     |
|     |               |             |      |           |            |                |      |     |              |             |              |        |              |        |              |        |              |        | 維持工事  |     |
| 1   | 霞ヶ関橋          | 多摩市道1-1号幹線  | 1974 | 38.6      | 11.8       | 鋼床版単純桁橋        | 2019 | I   |              |             |              |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 2   | 明神橋 (道路橋)     | 多摩市道1-3号幹線  | 1976 | 66        | 8.8        | 鋼床版単純合成箱桁橋     | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 1,278  |       |     |
| 3   | 明神橋 (人道橋)     | 多摩市道1-3号幹線  | 2010 | 58.4      | 3.5        | 単純鋼床版二主板桁橋     | 2019 | I   |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 574    |       |     |
| 4   | 若帖橋           | 多摩市道1-6号線   | 1963 | 9.9       | 3          | RC-T桁橋         | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 84     |       |     |
| 5   | 一ノ宮集会所前橋      | 多摩市道1-50号線  | 1974 | 8.8       | 5          | RCスリット橋        | 2019 | I   |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 124    |       |     |
| 6   | 一ノ宮児童館前橋      | 多摩市道1-54号線  | 1993 | 2.5       | 6.4        | RCスリット橋(H4年架替) | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 45     |       |     |
| 7   | 東寺方橋          | 多摩市道1-95号線  | 1976 | 40.2      | 6.8        | PC橋単純桁橋        | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 767    |       |     |
| 8   | 1-290-1橋      | 多摩市道1-290号線 | 1967 | 2.4       | 3.3        | RCスリット橋        | 2019 | I   |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 23     |       |     |
| 9   | 和田原通り橋        | 多摩市道2-4号幹線  | 1974 | 4.7       | 8.1        | 単純PCI桁橋        | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 107    |       |     |
| 10  | 新堂橋 (道路橋)     | 多摩市道2-7号線   | 1970 | 37.8      | 7.38       | PC単純桁橋         | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 499    |       |     |
| 11  | 並木橋 (道路橋)     | 多摩市道2-50号線  | 1970 | 37.9      | 7.1        | PC単純桁橋         | 2019 | III |              | 設計          |              | 3,934  |              |        |              | 補修/点検  | 支承 塗替塗装工     | 15,500 |       |     |
| 12  | 久保ヶ下橋 (道路橋)   | 多摩市道2-101号線 | 1971 | 47.3      | 8          | 単純鋼床版桁橋        | 2019 | III |              | 補修          | 塗替塗装工        | 60,000 |              |        |              |        | 点検           | 637    |       |     |
| 13  | 桜橋            | 多摩市道3-26号線  | 1984 | 62.7      | 7          | 2径間連続PC箱桁橋     | 2019 | I   |              | 耐震          | 落橋防止シールド設置工  | 82,500 |              | 耐震     | 落橋防止シールド設置工  | 82,500 | 点検           | 1,231  |       |     |
| 14  | 向ノ岡橋          | 多摩市道3-30号線  | 2010 | 42        | 10.2       | 鋼単純非合成版桁橋      | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 1,202  |       |     |
| 15  | 車橋            | 多摩市道3-98号線  | 1970 | 30.4      | 4.8        | PC単純T桁橋        | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 410    |       |     |
| 16  | 多摩中学校北側橋      | 多摩市道1-4号線   | 1991 | 10.4      | 3.3        | PC単純I桁橋        | 2019 | I   |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 97     |       |     |
| 17  | 熊野橋           | 多摩市道3-1号幹線  | 1975 | 31        | 18.8       | PC単純合成I桁橋      | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 1,635  |       |     |
| 18  | 南田橋           | 多摩市道3-148号線 | 1970 | 29.4      | 8.8        | PC単純T桁橋        | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 726    |       |     |
| 19  | 馬引沢橋          | 多摩市道3-147号線 | 1971 | 29.3      | 6.7        | PC単純T桁橋        | 2019 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 551    |       |     |
| 20  | 電車見橋          | 多摩市道4-10号歩線 | 1979 | 106       | 6.6        | PC3径間連続桁橋      | 2020 | II  | 補修/耐震        | 落橋防止シールド設置工 | 38,000       |        |              |        |              |        | 点検           | 1,458  |       |     |
| 21  | 中諏訪橋          | 多摩市道4-10号歩線 | 1975 | 49.3      | 4.6        | PC斜材付n型ラーメン橋   | 2020 | I   |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 473    |       |     |
| 22  | ふれあい橋         | 多摩市道4-10号歩線 | 1971 | 44.3      | 4.6        | PC斜材付n型ラーメン橋   | 2020 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 425    |       |     |
| 23  | 瓜生小南側ベテ橋      | 多摩市道4-15号歩線 | 1978 | 24.6      | 6.5        | RC-T桁橋         | 2020 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 334    |       |     |
| 24  | ささやき橋         | 多摩市道4-10号歩線 | 1978 | 34        | 4.6        | PC斜材付n型ラーメン橋   | 2020 | I   |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 326    |       |     |
| 25  | 瓜生見返り橋        | 多摩市道4-10号歩線 | 1977 | 75        | 6.6        | PC3径間連続桁橋      | 2020 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 1,032  |       |     |
| 26  | さんかく橋         | 多摩市道4-11号歩線 | 1978 | 72        | 7.9        | PC2径間連続斜張橋     | 2020 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 1,186  |       |     |
| 27  | 瓜生小北側ベテ橋      | 多摩市道4-15号歩線 | 1978 | 20.6      | 4.6        | PC単純中空床版橋      | 2020 | III |              |             |              |        | 補修           | 断面修復工  | 25,000       |        | 点検           | 198    |       |     |
| 28  | みどり橋          | 多摩市道4-11号歩線 | 1978 | 34        | 4.6        | PC斜材付n型ラーメン橋   | 2020 | III |              |             |              |        | 補修           | 舗装打換工  | 20,000       |        | 点検           | 326    |       |     |
| 29  | けやき橋          | 多摩市道4-9号歩線  | 1976 | 33.8      | 4.6        | PC単純中空床版橋      | 2020 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 設計/点検        | 452    |       |     |
| 30  | 永山学園橋         | 多摩市道4-10号歩線 | 1975 | 68.1      | 4.8        | PC張出桁・ケム橋      | 2020 | II  |              |             |              |        | 設計           |        | 681          |        | 補修/点検        | 断面修復工  | 7,444 |     |
| 31  | やなぎ橋          | 多摩市道4-10号歩線 | 1975 | 36.2      | 4.6        | PC斜材付n型ラーメン橋   | 2020 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 347    |       |     |
| 32  | やすらぎ橋         | 多摩市道4-3号歩線  | 1975 | 39.7      | 6.6        | PC単純ケム橋        | 2020 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 546    |       |     |
| 33  | 諏訪北橋          | 多摩市道4-10号歩線 | 1975 | 39        | 4.6        | PC斜材付n型ラーメン橋   | 2020 | I   |              |             |              |        |              |        |              |        | 点検           | 374    |       |     |
| 34  | かえり橋          | 多摩市道4-22号歩線 | 1975 | 39.8      | 4.6        | PC単純ケム橋        | 2020 | II  |              |             |              |        |              |        |              |        | 設計/点検        | 1,623  |       |     |
| 35  | 永山駅西側ベテ橋      | 多摩市道4-22号歩線 | 1975 | 20.5      | 4.6        | PC単純ケム橋        | 2020 | II  |              |             |              |        | 設計           |        | 278          | 補修     | 断面修復工        | 2,780  | 点検    | 197 |
| 36  | 釜沼橋           | 多摩市道5-1号幹線  | 1970 | 22        | 16.7       | 単純合成格子版桁橋      | 2021 | II  | 点検           |             | 1,006        |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 37  | 平戸小橋          | 多摩市道5-21号線  | 1974 | 21.4      | 1.9        | 単純鋼桁橋          | 2021 | II  | 点検           |             | 112          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 38  | 平戸橋           | 多摩市道5-15号線  | 1972 | 21.6      | 6.8        | PC単純T桁橋        | 2021 | II  | 点検           |             | 403          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 39  | 久保谷橋          | 多摩市道5-19号線  | 1972 | 22.3      | 6.8        | PC単純T桁橋        | 2021 | I   | 点検           |             | 416          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 40  | 上之根小橋         | 多摩市道5-21号線  | 1988 | 15.7      | 3.3        | PC単純中空床版橋      | 2021 | I   | 点検           |             | 142          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 41  | 上之根橋          | 多摩市道5-2号幹線  | 1972 | 15.7      | 23.8       | PC単純T桁橋        | 2021 | II  | 点検           |             | 1,023        |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 42  | 落合橋           | 多摩市道5-86号線  | 1973 | 15.6      | 25.8       | PC単純T桁橋        | 2017 | II  |              | 点検          | 454          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 43  | 長久保橋          | 多摩市道5-41号線  | 1975 | 15.5      | 9          | PC単純T桁橋        | 2017 | II  |              | 点検          | 158          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 44  | 多摩センター駅西側ベテ橋  | 多摩市道5-34号歩線 | 1982 | 27.3      | 6.7        | PC門型ラーメン橋      | 2017 | II  |              | 点検          | 207          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 45  | センター駅連絡メインベテ橋 | 多摩市道5-33号歩線 | 1979 | 20.5      | 19.2       | PC門型ラーメン橋      | 2017 | II  |              | 点検          | 444          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 46  | センター駅副方デッキ橋   | 多摩市道5-34号歩線 | 1979 | 279.3     | 8.2        | PC中空床版・RCラーメン橋 | 2017 | III |              | 点検          | 2,581        |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 47  | 多摩センター大橋      | 多摩市道5-33号歩線 | 1979 | 84.9      | 20         | PC2径間連続T桁橋     | 2017 | II  |              | 点検          | 1,914        |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 48  | 多摩センター大橋東脇橋   | 多摩市道5-33号歩線 | 1979 | 84.9      | 5          | PC2径間連続T桁橋     | 2017 | II  |              | 点検          | 479          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 49  | 多摩センター大橋西脇橋   | 多摩市道5-33号歩線 | 1979 | 84.9      | 5          | PC2径間連続T桁橋     | 2017 | II  |              | 点検          | 479          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 50  | 多摩センター大橋西側橋   | 多摩市道5-34号歩線 | 1980 | 29.5      | 6.5        | PC単純中空床版橋      | 2017 | III |              | 設計/点検       | 4,452        |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 51  | ゆうゆう橋         | 多摩市道5-31号歩線 | 1980 | 93.2      | 15         | 3径間連続PC箱桁橋     | 2017 | II  |              | 点検          | 1,576        |        |              |        |              | 設計     |              | 6,077  |       |     |
| 52  | 多摩郵便局東道路橋     | 多摩市道6-2号幹線  | 1980 | 71        | 25         | 3径間連続PC箱桁橋     | 2017 | II  |              | 点検          | 2,001        |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 53  | レンガ坂橋         | 多摩市道5-35号歩線 | 1981 | 36.5      | 11         | PC門型ラーメン橋      | 2017 | II  |              | 点検          | 453          | 補修     | 舗装打換工        | 54,000 |              |        |              |        |       |     |
| 54  | バルテノン中央橋      | 多摩市道5-33号歩線 | 1981 | 38        | 20         | PC門型ラーメン橋      | 2017 | II  |              | 点検          | 857          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 55  | バルテノン東脇橋      | 多摩市道5-33号歩線 | 1981 | 38        | 5          | PC門型ラーメン橋      | 2017 | II  |              | 点検          | 215          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 56  | バルテノン西脇橋      | 多摩市道5-33号歩線 | 1981 | 38        | 5          | PC門型ラーメン橋      | 2017 | II  |              | 点検          | 215          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 57  | 白山橋           | 多摩市道5-31号歩線 | 1983 | 36.5      | 8          | PC門型ラーメン橋      | 2017 | II  |              | 点検          | 330          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 58  | 多1・3・6-1号橋    | 多摩市道5-31号歩線 | 1980 | 36.5      | 12         | PC門型ラーメン橋      | 2017 | II  |              | 点検          | 494          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |
| 59  | 豊ヶ丘北公園南側ベテ橋   | 多摩市道5-17号歩線 | 1982 | 22        | 5.8        | PC単純中空床版橋      | 2021 | I   | 点検           |             | 350          |        |              |        |              |        |              |        |       |     |

表 6-5. 短期計画事業一覧 (2/6)

| No. | 橋梁名          | 路線名         | 架設年  | 橋長<br>(m) | 全幅員<br>(m) | 構造形式          | 点検結果 |     | 2021 (R3) 年度 |        | 2022 (R4) 年度 |        | 2023 (R5) 年度 |        | 2024 (R6) 年度 |            | 2025 (R7) 年度 |        |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|
|     |              |             |      |           |            |               | 実施時期 | 健全性 | 216,939千円    |        | 270,611千円    |        | 249,338千円    |        | 303,296千円    |            | 303,166千円    |        |
|     |              |             |      |           |            |               |      |     | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円)     | 主な対策内容       | 費用(千円) |
|     |              |             |      |           |            |               |      |     | 維持工事         |        | 維持工事         |        | 維持工事         |        | 維持工事         |            | 維持工事         |        |
| 60  | きたとよ橋        | 多摩市道5-9号歩線  | 1978 | 31.5      | 4.6        | PC単純和-スラ橋     | 2021 | I   | 点検           | 397    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 61  | 213号橋        | 多摩市道5-2号歩線  | 1982 | 24        | 5.8        | PC単純中空床版橋     | 2021 | I   | 点検           | 382    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 62  | 211号線道路橋     | 多摩市道5-60号線  | 1983 | 16        | 7.2        | RCア-メBOX橋     | 2021 | I   | 点検           | 316    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 63  | バブルコニー橋      | 多摩市道5-6号歩線  | 1983 | 38        | 6          | PC3径間連続中空床版橋  | 2021 | II  | 点検           | 625    | 0            | 設計     | 1,255        | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 64  | とちのき橋        | 多摩市道5-9号歩線  | 1976 | 34.1      | 6.6        | PC斜材付n型ア-メ橋   | 2021 | I   | 点検           | 617    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 65  | こぶし橋         | 多摩市道5-11号歩線 | 1978 | 37.1      | 4.6        | PC斜材付n型ア-メ橋   | 2021 | I   | 点検           | 468    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 66  | 白雲橋          | 多摩市道5-8号歩線  | 1978 | 36.6      | 4.6        | 鋼板桁方杖ア-メ橋     | 2021 | II  | 点検           | 461    | 0            | 設計     | 713          | 0      | 補修           | 断面修復工      | 7,130        |        |
| 67  | 豊ヶ丘南公園東側ベテ橋  | 多摩市道5-23号歩線 | 1975 | 58.3      | 3.1        | PC3径間連続中空床版橋  | 2021 | I   | 点検           | 495    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 68  | 医者村橋         | 多摩市道5-14号歩線 | 1972 | 60.9      | 4.6        | PC単純桁橋        | 2021 | III | 点検           | 767    | 設計           | 6,187  | 0            | 0      | 補修           | 断面修復工      | 10,000       |        |
| 69  | 貝取派出所脇ベテ橋    | 多摩市道5-11号歩線 | 1975 | 23.8      | 6.6        | PC門型ア-メ橋      | 2021 | I   | 点検           | 431    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 70  | 卸売市場西側橋      | 多摩市道4-95号線  | 1979 | 58.1      | 15         | PC斜材付n型ア-メ橋   | 2020 | II  |              | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 補修/点検        | 伸縮装置 取替工   | 87,317       |        |
| 71  | 豊ヶ丘第6公園南側ベテ橋 | 多摩市道5-21号歩線 | 1975 | 37.2      | 3.1        | PC2径間連続中空床版橋  | 2021 | II  | 点検           | 316    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 72  | 202-E号橋      | 多摩市道5-11号歩線 | 1972 | 30.7      | 4.6        | PC斜材付n型ア-メ橋   | 2021 | I   | 点検           | 387    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 73  | 南野スカイブリッジ    | 多摩市道5-22号歩線 | 1978 | 71.3      | 4.6        | PC3径間連続中空床版橋  | 2021 | I   | 点検           | 898    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 74  | ふんすい橋        | 多摩市道5-14号歩線 | 1976 | 55.3      | 5.6        | PC単純T桁橋       | 2021 | III | 点検           | 848    | 設計           | 6,839  | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 75  | 落合第一歩道橋      | 多摩市道5-24号歩線 | 1973 | 17.9      | 5.7        | PC単純中空床版橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 115    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 76  | 落合第二歩道橋      | 多摩市道5-26号歩線 | 1973 | 27.7      | 5.7        | PC単純中空床版橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 178    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 77  | 落合南公園東側ベテ橋   | 多摩市道5-27号歩線 | 1973 | 17.9      | 5.7        | PC単純中空床版橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 115    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 78  | 落合第四歩道橋      | 多摩市道5-26号歩線 | 1973 | 27.7      | 5.7        | PC単純中空床版橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 178    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 79  | 一本杉橋         | 多摩市道5-26号歩線 | 1981 | 84.9      | 6.6        | PC2径間非対称斜張橋   | 2017 | III |              | 0      | 点検           | 632    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 80  | 恐竜橋          | 多摩市道5-28号歩線 | 1981 | 25.6      | 5.7        | PC単純中空スラ橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 165    | 0            | 設計     | 919          | 0          | 0            |        |
| 81  | 311号橋        | 多摩市道5-40号歩線 | 1978 | 25.2      | 6.6        | RC斜材付n型ア-メ橋   | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 188    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 82  | 風の橋          | 多摩市道5-28号歩線 | 1978 | 65.6      | 7.6        | PC有ヒツア-メ橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 562    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 83  | るんるん橋        | 多摩市道5-11号歩線 | 1982 | 34        | 6.8        | PCL*形ア-メ橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 261    | 0            | 0      | 設計           | 613        | 0            |        |
| 84  | るんるん橋西側ベテ橋   | 多摩市道5-11号歩線 | 1978 | 34.1      | 6.6        | PC斜材付n型ア-メ橋   | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 254    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 85  | 宝野橋          | 多摩市道5-38号歩線 | 1981 | 34.5      | 4.8        | PC単純中空床版橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 187    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 86  | 落合第5公園西側ベテ橋  | 多摩市道5-38号歩線 | 1982 | 29.5      | 4.8        | RC3径間連続中空床版橋  | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 160    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 87  | にしおち橋        | 多摩市道5-11号歩線 | 1982 | 31        | 4.8        | PCL*形ア-メ橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 168    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 88  | いちょう橋        | 多摩市道5-35号歩線 | 1978 | 64        | 7.6        | PC有ヒツア-メ橋     | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 549    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 89  | 307-1号橋      | 多摩市道5-11号歩線 | 1981 | 30        | 8.8        | PC門型ア-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 298    | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 90  | ゆたか橋         | 多摩市道5-22号歩線 | 1975 | 29.7      | 4.6        | PC3径間連続中空床版橋  | 2021 | II  | 点検           | 375    | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 91  | 稲荷橋          | 多摩市道6-8号線   | 1975 | 12.1      | 20.8       | PC単純T桁橋       | 2018 | III |              | 0      | 0            | 点検     | 429          | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 92  | 稲荷橋南側京王線鉄道脇橋 | 多摩市道6-12号線  | 1981 | 26        | 7.2        | PC単純T桁橋       | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 319          | 設計     | 1,163        | 0          | 0            |        |
| 93  | めぐみの橋        | 多摩市道6-2号歩線  | 1981 | 31.4      | 6.5        | PC門型ア-メ橋      | 2018 | III |              | 0      | 0            | 点検     | 348          | 設計     | 20,000       | 0          | 0            |        |
| 94  | はなみずき橋西側ベテ橋  | 多摩市道6-5号歩線  | 1978 | 34        | 6.6        | PC斜材付n型ア-メ橋   | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 382          | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 95  | はなみずき橋       | 多摩市道6-6号歩線  | 1978 | 37        | 6.6        | PC斜材付n型ア-メ橋   | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 416          | 設計     | 1,222        | 0          | 0            |        |
| 96  | 鶴牧第1公園北側ベテ橋  | 多摩市道6-7号歩線  | 1978 | 25.6      | 6.6        | RC斜材付n型ア-メ橋   | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 288          | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 97  | 鶴乃橋          | 多摩市道6-9号歩線  | 1983 | 87        | 5.3        | PC有ヒツア-メ橋     | 2018 | II  |              | 0      | 補修           | 剥落防止工  | 46,500       | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 98  | 唐木田駅前道路橋     | 多摩市道6-5号幹線  | 1989 | 42.7      | 18         | PC*トレンジョン橋    | 2017 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 1,308        | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 99  | 唐木田駅前広場橋     | 多摩市道6-5号幹線  | 1989 | 35.3      | 35.5       | PC単純T桁橋       | 2017 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 2,132        | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 100 | 剣橋           | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 47.5      | 7.1        | PC単純中空床版Tア-メ橋 | 2018 | II  |              | 0      | 設計           | 20,000 | 点検           | 574    | 耐震           | 落橋防止ア-メ設置工 | 90,000       |        |
| 101 | 元気橋          | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 25        | 4.8        | PC単純中空床版橋     | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 205          | 0      | 0            | 設計         | 804          |        |
| 102 | ひじり中央橋       | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 30        | 6.8        | PC単純中空床版橋     | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 348          | 0      | 0            | 設計         | 1,250        |        |
| 103 | 聖ヶ丘橋         | 多摩市道3-198号線 | 1980 | 80        | 10.4       | 鋼下路式ア-メ橋      | 2018 | III |              | 0      | 0            | 設計/点検  | 12,306       | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 104 | おもいで橋        | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 30        | 5.8        | PC単純中空床版橋     | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 297          | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 105 | ふたて橋         | 多摩市道3-7号歩線  | 1984 | 74.9      | 4.8        | PC単純中空床版橋     | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 設計/点検  | 2,970        | 補修     | 舗装打換工        | 23,580     | 0            |        |
| 106 | 船形橋          | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 22        | 4.8        | PC単純中空床版橋     | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 180          | 0      | 0            | 0          | 0            |        |
| 107 | 大谷戸公園南側ベテ橋   | 多摩市道3-1号歩線  | 1987 | 30        | 4.8        | PC単純中空床版橋     | 2018 | II  |              | 0      | 0            | 点検     | 245          | 0      | 0            | 設計         | 690          |        |
| 108 | 愛宕第一歩道橋      | 多摩市道2-5号歩線他 | 1971 | 33.5      | 2.9        | 鋼床版I形門型ア-メ橋   | 2019 | II  |              | 0      | 0            | 0      | 点検           | 273    | 0            | 0          | 0            |        |
| 109 | 切通し橋         | 多摩市道6-2号歩線  | 1970 | 19        | 3          | PC中空床版ア-メ橋    | 2019 | II  |              | 0      | 0            | 0      | 点検           | 160    | 0            | 0          | 0            |        |
| 110 | 健康センター南側BOX橋 | 多摩市道1-88号線  | 1986 | 2         | 17.8       | RC-BOX橋       | 2019 | II  |              | 0      | 0            | 0      | 点検           | 100    | 0            | 0          | 0            |        |
| 111 | 九頭龍公園南側BOX橋  | 多摩市道1-80号線  | 1986 | 2.8       | 5          | RC-BOX橋       | 2019 | I   |              | 0      | 0            | 0      | 点検           | 40     | 0            | 0          | 0            |        |
| 112 | 一宮団地西側水路橋    | 多摩市道1-126号線 | 1963 | 2.5       | 8.6        | RCコノト床版単純橋    | 2019 | I   |              | 0      | 0            | 0      | 点検           | 61     | 0            | 0          | 0            |        |
| 113 | 体育館南側水路橋     | 多摩市道2-83号線  | 1963 | 2.6       | 1.9        | RC床版桁橋        | 2019 | III |              | 0      | 0            | 0      | 点検           | 14     | 0            | 0          | 0            |        |
| 114 | 2号水路1号BOX橋   | 多摩市道4-3号線   | 1971 | 5.5       | 15.7       | RC-BOX橋       | 2020 | I   |              | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 点検           | 180        | 0            |        |
| 115 | 2号水路2号BOX橋   | 多摩市道4-5号線   | 1975 | 5.5       | 6.7        | RC-BOX橋       | 2020 | I   |              | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 点検           | 77         | 0            |        |
| 116 | 2号水路3号BOX橋   | 多摩市道4-6号線   | 1971 | 5.5       | 6.7        | RC-BOX橋       | 2020 | I   |              | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 点検           | 77         | 0            |        |
| 117 | 2号水路4号BOX橋   | 多摩市道4-8号線   | 1975 | 5.5       | 6.8        | RC床版桁橋        | 2020 | I   |              | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 点検           | 78         | 0            |        |
| 118 | 3号水路1号BOX橋   | 多摩市道4-12号線  | 1991 | 12.3      | 7.2        | RC-BOX橋       | 2020 | I   |              | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 点検           | 185        | 0            |        |

表 6-6. 短期計画事業一覧 (3/6)

| No. | 橋梁名             | 路線名         | 架設年  | 橋長<br>(m) | 全幅員<br>(m) | 構造形式              | 点検結果 |      | 2021 (R3) 年度 |         | 2022 (R4) 年度 |        | 2023 (R5) 年度 |        | 2024 (R6) 年度 |        | 2025 (R7) 年度 |        |
|-----|-----------------|-------------|------|-----------|------------|-------------------|------|------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|     |                 |             |      |           |            |                   | 実施時期 | 健全性  | 216,939千円    |         | 270,611千円    |        | 249,338千円    |        | 303,296千円    |        | 303,166千円    |        |
|     |                 |             |      |           |            |                   |      |      | 主な対策内容       | 費用(千円)  | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円) |
|     |                 |             |      |           |            |                   |      | 維持工事 | 20,000       | 維持工事    | 20,000       | 維持工事   | 20,000       | 維持工事   | 20,000       | 維持工事   | 20,000       |        |
| 119 | 4号水路1号BOX橋      | 多摩市道5-8号線   | 1992 | 6.2       | 11.6       | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 197     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 120 | 4号水路2号BOX橋      | 多摩市道5-12号線  | 1992 | 8.7       | 6.1        | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 146     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 121 | 4号水路3号BOX橋      | 多摩市道5-45号線  | 1992 | 7.9       | 6.6        | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 143     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 122 | 4号水路4号BOX橋      | 多摩市道5-53号線  | 1978 | 5.8       | 6.6        | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 105     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 123 | 4号水路5号BOX橋      | 多摩市道5-56号線  | 1978 | 5.6       | 6.6        | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 102     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 124 | 4号水路6号BOX橋      | 多摩市道5-60号線  | 1992 | 5.3       | 12.6       | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 183     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 125 | 4号水路7号BOX橋      | 多摩市道5-55号線  | 1981 | 5         | 6.6        | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 91      |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 126 | 5号水路1号BOX橋      | 多摩市道5-22号線  | 1978 | 6.6       | 18.6       | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 337     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 127 | 5号水路2号BOX橋      | 多摩市道5-34号線  | 1979 | 7.8       | 6.6        | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 141     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 128 | 5号水路3号BOX橋      | 多摩市道5-79号線  | 1990 | 9.6       | 6.6        | RC-BOX橋           | 2021 | I    | 点検           | 174     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 129 | 7号水路1号BOX橋      | 多摩市道6-17号線  | 1976 | 6.8       | 9.2        | RC-BOX橋           | 2018 | III  |              | 0       |              | 点検     | 107          |        |              |        |              |        |
| 130 | 7号水路2号BOX橋      | 多摩市道6-27号線  | 1976 | 7.6       | 9.5        | RC-BOX橋           | 2018 | III  |              | 0       |              | 点検     | 123          |        |              |        |              |        |
| 131 | 7号水路3号BOX橋      | 多摩市道6-2号幹線  | 1976 | 7         | 20.6       | RC-BOX橋           | 2018 | III  |              | 0       |              | 点検     | 246          |        |              |        |              |        |
| 132 | 7号水路4号BOX橋      | 多摩市道6-127号線 | 1976 | 7         | 6.6        | RC-BOX橋           | 2018 | III  |              | 0       |              | 点検     | 79           |        |              |        |              |        |
| 133 | 7号水路5号BOX橋      | 多摩市道6-124号線 | 1977 | 7.1       | 6.6        | RC-BOX橋           | 2018 | III  |              | 0       |              | 点検     | 80           |        |              |        |              |        |
| 134 | 7号水路6号BOX橋      | 多摩市道6-122号線 | 1977 | 6.2       | 6.6        | RC-BOX橋           | 2018 | III  |              | 0       |              | 点検     | 70           |        |              |        |              |        |
| 135 | 大貝戸小橋           | 多摩市道5-5号線   | 1993 | 22.9      | 3.8        | PC単純中空床版橋         | 2021 | I    | 点検           | 239     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 136 | 119号橋           | 多摩市道4-28号歩線 | 1982 | 25.4      | 4.8        | PC単純中空床版橋         | 2020 | II   |              | 0       |              |        |              |        | 点検           | 255    |              |        |
| 137 | 鶴牧中東側ベテ橋        | 多摩市道6-4号歩線  | 1983 | 28.5      | 4.8        | RC3径間連続中空床版橋      | 2018 | II   |              | 0       |              | 点検     | 233          |        |              |        |              |        |
| 138 | 南鶴牧小西側ベテ橋       | 多摩市道6-4号歩線  | 1977 | 46.5      | 6.6        | RC斜材付n型ラーメン橋      | 2018 | II   |              | 0       |              | 設計/点検  | 3,026        |        | 補修           | 舗装打換工  | 25,030       |        |
| 139 | 貝取第5公園東側ベテ橋     | 多摩市道4-27号歩線 | 1977 | 50        | 4.6        | PC3径間連続中空床版橋      | 2020 | II   |              | 0       |              |        |              |        | 設計/点検        | 20,480 |              |        |
| 140 | 永山小橋            | 多摩市道4-11号線  | 1988 | 26.3      | 3.2        | PC単純T桁橋           | 2020 | I    |              | 0       |              |        |              |        | 点検           | 176    |              |        |
| 141 | センター総合レジャーベテ橋   | 多摩市道5-33号歩線 | 1994 | 21.2      | 6.4        | PC単純中空床版橋         | 2017 | II   |              | 0       | 点検           | 153    |              |        |              |        |              |        |
| 142 | 多摩センター西側ベテ橋     | 多摩市道6-2号歩線  | 1994 | 75.6      | 4.8        | 3径間連続鋼床版箱桁橋       | 2017 | II   |              | 0       | 点検           | 409    | 設計           | 15,000 |              | 耐震     | 落橋防止ネット設置工   | 80,000 |
| 143 | であい橋            | 多摩市道5-17号線  | 1994 | 22        | 8.8        | PC単純中空床版橋         | 2021 | I    | 点検           | 530     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 144 | 大橋              | 多摩市道5-154号線 | 1972 | 27.4      | 10.8       | 活荷重単純合成鋼桁橋        | 2021 | I    | 設計/点検        | 5,072   |              |        |              | 補修     | 塗装塗替工        | 75,000 |              |        |
| 145 | 鶴牧西公園西側ベテ橋      | 多摩市道6-12号歩線 | 1990 | 43.2      | 3.8        | RC斜材付n型ラーメン橋      | 2018 | III  |              | 0       |              | 点検     | 280          |        |              |        |              |        |
| 146 | 多広路1-1橋         | 多摩市道5-13号歩線 | 1981 | 85        | 4.8        | PC片持固定橋           | 2021 | I    | 補修/耐震/点検     | 炭素繊維補強工 | 136,117      |        |              |        |              |        |              |        |
| 147 | 報恩橋             | 多摩市道3-76号線  | 1974 | 55.8      | 5.3        | RCスリットPC単純T桁橋     | 2019 | I    |              | 0       |              |        |              | 点検     | 830          |        |              |        |
| 148 | 鶴牧西公園南側ベテ橋      | 多摩市道6-4号歩線  | 1980 | 30.6      | 4.8        | RC3径間連続中空床版橋      | 2018 | II   |              | 0       |              | 点検     | 250          |        |              |        |              |        |
| 149 | 多2・1・11-2号橋     | 多摩市道6-3号歩線  | 1980 | 50        | 6.5        | PC3径間連続A-スラブ橋     | 2018 | II   |              | 0       |              | 点検     | 553          |        |              |        |              |        |
| 150 | 鶴牧東公園北側ベテ橋      | 多摩市道6-13号歩線 | 1982 | 34.4      | 6.8        | RC3径間連続中空床版橋      | 2018 | II   |              | 0       |              | 点検     | 398          |        |              |        |              |        |
| 151 | 318-2号橋         | 多摩市道5-29号歩線 | 1983 | 26.5      | 4.5        | PC門型ラーメン橋         | 2017 | II   |              | 0       | 点検           | 135    |              |        |              |        |              |        |
| 152 | 中和田橋            | 多摩市道2-93号線  | 1998 | 37.4      | 3.8        | RCスリットPC単純T桁橋     | 2019 | I    |              | 0       |              |        |              | 点検     | 399          |        |              |        |
| 153 | 211号橋           | 多摩市道5-45号歩線 | 1982 | 24        | 5.8        | PC単純中空床版橋         | 2021 | I    | 点検           | 382     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 154 | プリータブリッジ        | 多摩市道1-1号歩線  | 1999 | 35.1      | 8          | 立体ラーメン式鋼床版箱桁橋     | 2019 | I    |              | 0       |              |        |              | 点検     | 788          |        |              |        |
| 155 | モノレール連絡橋        | 多摩市道6-2号歩線  | 1999 | 5.7       | 8          | T桁歩道橋             | 2018 | I    |              | 0       |              | 点検     | 78           |        |              |        |              |        |
| 156 | E-1デッキ          | 多摩市道5-48号歩線 | 2003 | 182.6     | 4.9        | RC連続桁橋            | 2017 | III  |              | 0       | 点検           | 1,009  |              |        |              |        |              |        |
| 157 | 多2・1・10-4橋      | 多摩市道5-32号歩線 | 1980 | 40        | 6.5        | PC中空床版斜n橋         | 2017 | II   |              | 0       | 点検           | 293    |              |        |              |        |              |        |
| 158 | 多1・3・6-2号橋      | 多摩市道5-48号歩線 | 1988 | 38.6      | 4.5        | PC単純箱桁橋           | 2017 | II   |              | 0       | 点検           | 196    |              |        |              |        |              |        |
| 159 | 318-1号橋         | 多摩市道5-48号歩線 | 1983 | 26.5      | 4.5        | PC門型ラーメン橋         | 2017 | II   |              | 0       | 点検           | 135    |              |        |              |        |              |        |
| 160 | 多1・3・5-3号橋      | 多摩市道5-31号歩線 | 1981 | 36.5      | 11         | PC門型ラーメン橋         | 2018 | II   |              | 0       | 点検           | 684    | 補修           | 舗装打換工  | 30,680       |        |              |        |
| 161 | 多1・3・3-1号橋      | 多摩市道5-36号歩線 | 1980 | 96        | 7.8        | PC3径間連続桁橋(中央有トラス) | 2017 | II   |              | 0       | 点検           | 844    |              |        |              |        |              |        |
| 162 | 307-2号橋         | 多摩市道6-10号歩線 | 1981 | 22        | 7          | PC中空床版橋           | 2018 | II   |              | 0       | 点検           | 262    |              |        |              |        |              |        |
| 163 | 308号橋           | 多摩市道5-36号歩線 | 2004 | 22.2      | 6.8        | RCカ-ラーメン橋         | 2018 | II   |              | 0       | 点検           | 257    |              |        |              |        |              |        |
| 164 | K209号橋          | 多摩市道5-50号歩線 | 1982 | 15.6      | 15         | RC単純中空床版桁橋        | 2021 | I    | 点検           | 641     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 165 | K216号橋          | 多摩市道5-50号歩線 | 1983 | 15.3      | 4.8        | RC単純中空床版桁橋        | 2021 | II   | 点検           | 202     |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 166 | 大貝戸橋            | 多摩市道2-5号幹線  | 1969 | 12        | 16.8       | PC単純I桁橋           | 2019 | III  | 設計           | 2,903   |              |        |              | 点検     | 566          | 補修     | 舗装打換工        | 25,000 |
| 167 | 下落合橋            | 多摩市道5-37号線  | 2007 | 15.6      | 3.3        | PCスリットPC床版桁橋      | 2017 | I    |              | 0       | 点検           | 59     |              |        |              |        |              |        |
| 168 | 永山ハイウェイ歩道橋      | 多摩市道4-22号歩線 | 1977 | 55.5      | 4.6        | PC単純床版桁橋          | 2020 | II   |              | 0       |              |        |              |        | 点検           | 532    |              |        |
| 169 | 永山駅北口歩道橋        | 多摩市道4-4号幹線  | 1994 | 58.7      | 3.4        | PC単純床版桁橋          | 2020 | I    |              | 0       |              |        |              |        | 点検           | 416    |              |        |
| 170 | 唐木田駅前自転車駐輪場橋    | 多摩市道6-5号幹線  | 1989 | 46.4      | 11.5       | 単純鋼床版I桁橋          | 2017 | I    |              | 0       |              | 点検     | 908          |        |              |        |              |        |
| 171 | 多摩センター駅東自転車駐輪場橋 | 多摩市道5-86号線  | 1980 | 29.1      | 3          | PC単純床版桁橋          | 2017 | III  |              | 0       | 点検           | 99     |              |        |              |        |              |        |
| 172 | 1-49-1橋         | 多摩市道1-49号線  | 1963 | 2         | 6          | RC-BOX橋           |      |      |              | 0       |              |        |              | 点検     | 34           |        |              |        |
| 173 | 1-56-1橋         | 多摩市道1-56号線  | 1963 | 2.5       | 6.3        | RC-BOX橋           |      |      |              | 0       |              |        |              | 点検     | 45           |        |              |        |
| 174 | 3-232-1橋        | 多摩市道3-232号線 | 1963 | 8         | 5.5        | RC床版桁橋            |      |      |              | 0       |              |        |              | 点検     | 124          |        |              |        |
| 175 | 3-73-1橋         | 多摩市道3-73号線  | 1963 | 2.2       | 4.5        | RC-BOX橋           |      |      |              | 0       |              |        |              | 点検     | 28           |        |              |        |
| 176 | 3-49-1橋         | 多摩市道3-49号線  | 1963 | 2.3       | 6          | RC-BOX橋           |      |      |              | 0       |              |        |              | 点検     | 39           |        |              |        |



表 6-7. 短期計画事業一覧 (4/6)

| No. | 橋梁名           | 路線名         | 架設年  | 橋長<br>(m) | 全幅員<br>(m) | 構造形式          | 点検結果 |     | 2026 (R8) 年度 |        | 2027 (R9) 年度 |          | 2028 (R10) 年度 |          | 2029 (R11) 年度 |          | 2030 (R12) 年度 |           |        |
|-----|---------------|-------------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|--------------|--------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|--------|
|     |               |             |      |           |            |               | 実施時期 | 健全性 | 301,762千円    |        | 280,444千円    |          | 261,134千円     |          | 251,916千円     |          | 247,323千円     |           |        |
|     |               |             |      |           |            |               |      |     | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容       | 費用(千円)   | 主な対策内容        | 費用(千円)   | 主な対策内容        | 費用(千円)   | 主な対策内容        | 費用(千円)    |        |
|     |               |             |      |           |            |               |      |     |              |        |              |          |               |          |               |          |               |           | 維持工事   |
| 1   | 霞ヶ関橋          | 多摩市道1-1号幹線  | 1974 | 38.6      | 11.8       | 鋼床版単純桁橋       | 2019 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 2   | 明神橋 (道路橋)     | 多摩市道1-3号幹線  | 1976 | 66        | 8.8        | 鋼床版単純合成桁橋     | 2019 | II  |              | 0      | 補修           | 塗替塗装工    | 61,350        |          | 0             | 点検       | 2,127         |           | 0      |
| 3   | 明神橋 (人道橋)     | 多摩市道1-3号幹線  | 2010 | 58.4      | 3.5        | 単純鋼床版二主版桁橋    | 2019 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 955      |               | 0         |        |
| 4   | 若貼橋           | 多摩市道1-6号線   | 1963 | 9.9       | 3          | RC-T桁橋        | 2019 | II  |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 139      |               | 0         |        |
| 5   | 一ノ宮集会場前橋      | 多摩市道1-50号線  | 1974 | 8.8       | 5          | RC-T桁橋        | 2019 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 205      |               | 0         |        |
| 6   | 一ノ宮児童館前橋      | 多摩市道1-54号線  | 1993 | 2.5       | 6.4        | RC-T桁橋(H4年架替) | 2019 | II  |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 75       |               | 0         |        |
| 7   | 東寺方橋          | 多摩市道1-95号線  | 1976 | 40.2      | 6.8        | PC橋単純桁橋       | 2019 | II  |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 1,277    |               | 0         |        |
| 8   | 1-290-1橋      | 多摩市道1-290号線 | 1967 | 2.4       | 3.3        | RC-T桁橋        | 2019 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 37       |               | 0         |        |
| 9   | 和田原通り橋        | 多摩市道2-4号幹線  | 1974 | 4.7       | 8.1        | 単純PCI桁橋       | 2019 | II  |              | 0      | 設計           | 222      |               | 0        | 補修/点検         | 断面修復工    | 2,398         |           | 0      |
| 10  | 新堂橋 (道路橋)     | 多摩市道2-7号線   | 1970 | 37.8      | 7.38       | PC単純桁橋        | 2019 | II  |              | 0      |              | 0        | 設計            | 1,260    | 点検            | 830      | 補修            | 舗装打換工     | 12,600 |
| 11  | 並木橋 (道路橋)     | 多摩市道2-50号線  | 1970 | 37.9      | 7.1        | PC単純桁橋        | 2019 | III |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 832      |               | 0         |        |
| 12  | 久保ヶ下橋 (道路橋)   | 多摩市道2-101号線 | 1971 | 47.3      | 8          | 単純鋼床版桁橋       | 2019 | III |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 1,060    |               | 0         |        |
| 13  | 桜橋            | 多摩市道3-26号線  | 1984 | 62.7      | 7          | 2径間連続PC箱桁橋    | 2019 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 2,050    |               | 0         |        |
| 14  | 向ノ岡橋          | 多摩市道3-30号線  | 2010 | 42        | 10.2       | 鋼単純非合成版桁橋     | 2019 | II  |              | 0      |              | 0        | 設計            | 3,096    | 点検            | 2,001    | 補修            | 塗替塗装工     | 30,960 |
| 15  | 串橋            | 多摩市道3-98号線  | 1970 | 30.4      | 4.8        | PC単純T桁橋       | 2019 | II  |              | 0      | 設計           | 687      |               | 0        | 補修/点検         | 断面修復工    | 7,551         |           | 0      |
| 16  | 多摩中学校北側橋      | 多摩市道1-4号線   | 1991 | 10.4      | 3.3        | PC単純I桁橋       | 2019 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 160      |               | 0         |        |
| 17  | 熊野橋           | 多摩市道3-1号幹線  | 1975 | 31        | 18.8       | PC単純合成I桁橋     | 2019 | II  | 設計           | 7,080  |              | 0        | 補修            | 伸縮装置 取替工 | 70,800        | 点検       | 2,722         |           | 0      |
| 18  | 南田橋           | 多摩市道3-148号線 | 1970 | 29.4      | 8.8        | PC単純T桁橋       | 2019 | II  | 設計           | 1,503  |              | 0        | 補修            | 舗装打換工    | 15,030        | 点検       | 1,208         |           | 0      |
| 19  | 馬引沢橋          | 多摩市道3-147号線 | 1971 | 29.3      | 6.7        | PC単純T桁橋       | 2019 | II  | 設計           | 2,162  |              | 0        | 補修            | 伸縮装置 取替工 | 21,620        | 点検       | 917           |           | 0      |
| 20  | 電車見橋          | 多摩市道4-10号歩線 | 1979 | 106       | 6.6        | PC3径間連続桁橋     | 2020 | II  |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 0        |               | 2,728     |        |
| 21  | 中諏訪橋          | 多摩市道4-10号歩線 | 1975 | 49.3      | 4.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋   | 2020 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 0        |               | 884       |        |
| 22  | ふれあい橋         | 多摩市道4-10号歩線 | 1971 | 44.3      | 4.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋   | 2020 | II  |              | 0      |              | 0        | 設計            | 5,621    |               | 0        | 耐震/点検         | 落橋防止対策設置工 | 57,005 |
| 23  | 瓜生小南側ベテ橋      | 多摩市道4-15号歩線 | 1978 | 24.6      | 6.5        | PC-T桁橋        | 2020 | II  |              | 0      |              | 0        | 設計            | 1,412    |               | 0        | 補修/点検         | 塗替塗装工     | 14,744 |
| 24  | さきやき橋         | 多摩市道4-10号歩線 | 1978 | 34        | 4.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋   | 2020 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 0        |               | 610       |        |
| 25  | 瓜生見返り橋        | 多摩市道4-10号歩線 | 1977 | 75        | 6.6        | PC3径間連続桁橋     | 2020 | II  |              | 0      |              | 0        | 設計            | 3,238    |               | 0        | 補修/点検         | 伸縮装置 取替工  | 34,310 |
| 26  | さんかく橋         | 多摩市道4-11号歩線 | 1978 | 72        | 7.9        | PC2径間連続斜張橋    | 2020 | II  |              | 0      |              | 0        | 設計            | 1,274    |               | 0        | 補修/点検         | 断面修復工     | 14,958 |
| 27  | 瓜生小北側ベテ橋      | 多摩市道4-15号歩線 | 1978 | 20.6      | 4.6        | PC単純中空床版橋     | 2020 | III |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 0        |               | 370       |        |
| 28  | みどり橋          | 多摩市道4-11号歩線 | 1978 | 34        | 4.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋   | 2020 | III |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 0        |               | 610       |        |
| 29  | けやき橋          | 多摩市道4-9号歩線  | 1976 | 33.8      | 4.6        | PC単純中空床版橋     | 2020 | II  |              | 0      | 補修           | ひびわれ注入工  | 1,280         |          | 0             | 点検       | 0             |           | 606    |
| 30  | 永山学園橋         | 多摩市道4-10号歩線 | 1975 | 68.1      | 4.8        | PC張出桁・ケ-ル-桁橋  | 2020 | II  |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 0        |               | 1,185     |        |
| 31  | やなぎ橋          | 多摩市道4-10号歩線 | 1975 | 36.2      | 4.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋   | 2020 | II  | 設計           | 860    |              | 0        | 補修            | 舗装打換工    | 8,600         |          | 0             | 点検        | 649    |
| 32  | やすらぎ橋         | 多摩市道4-3号歩線  | 1975 | 39.7      | 6.6        | PC単純ケ-ル-桁橋    | 2020 | II  |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 設計            | 599      | 点検            | 1,022     |        |
| 33  | 諏訪北橋          | 多摩市道4-10号歩線 | 1975 | 39        | 4.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋   | 2020 | I   |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 0        |               | 700       |        |
| 34  | かえり橋          | 多摩市道4-22号歩線 | 1975 | 39.8      | 4.6        | PC単純ケ-ル-桁橋    | 2020 | II  |              | 0      | 補修           | 伸縮装置 取替工 | 12,410        |          | 0             | 点検       | 0             |           | 714    |
| 35  | 永山駅西側ベテ橋      | 多摩市道4-22号歩線 | 1975 | 20.5      | 4.6        | PC単純ケ-ル-桁橋    | 2020 | II  |              | 0      |              | 0        |               | 0        | 点検            | 0        |               | 368       |        |
| 36  | 釜沼橋           | 多摩市道5-1号幹線  | 1970 | 22        | 16.7       | 単純合成格子版桁橋     | 2021 | II  | 点検           | 1,801  |              | 0        |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 37  | 平戸小橋          | 多摩市道5-21号線  | 1974 | 21.4      | 1.9        | 単純鋼桁橋         | 2021 | II  | 点検           | 199    | 設計           | 676      |               | 0        | 補修            | 塗替塗装工    | 6,760         |           | 0      |
| 38  | 平戸橋           | 多摩市道5-15号線  | 1972 | 21.6      | 6.8        | PC単純T桁橋       | 2021 | II  | 点検           | 720    |              | 0        |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 39  | 久保谷橋          | 多摩市道5-19号線  | 1972 | 22.3      | 6.8        | PC単純T桁橋       | 2021 | I   | 点検           | 743    |              | 0        |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 40  | 上之根小橋         | 多摩市道5-21号線  | 1988 | 15.7      | 3.3        | PC単純中空床版橋     | 2021 | I   | 点検           | 254    |              | 0        |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 41  | 上之根橋          | 多摩市道5-2号幹線  | 1972 | 15.7      | 23.8       | PC単純T桁橋       | 2021 | II  | 点検           | 1,831  |              | 0        |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 42  | 落合橋           | 多摩市道5-86号線  | 1973 | 15.6      | 25.8       | PC単純T桁橋       | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 978      |               | 0        |               | 0        | 設計            | 5,621     |        |
| 43  | 長久保橋          | 多摩市道5-41号線  | 1975 | 15.5      | 9          | PC単純T桁橋       | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 339      |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 44  | 多摩センター駅西側ベテ橋  | 多摩市道5-34号歩線 | 1982 | 27.3      | 6.7        | PC門型ラ-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 445      |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 45  | センター駅連絡メインベテ橋 | 多摩市道5-33号歩線 | 1979 | 20.5      | 19.2       | PC門型ラ-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 957      |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 46  | センター駅副方デッキ橋   | 多摩市道5-34号歩線 | 1979 | 279.3     | 8.2        | PC中空床版・RCラ-メ橋 | 2017 | III |              | 0      | 点検           | 5,568    |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 47  | 多摩センター大橋      | 多摩市道5-33号歩線 | 1979 | 84.9      | 20         | PC2径間連続T桁橋    | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 4,128    |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 48  | 多摩センター大橋東脇橋   | 多摩市道5-33号歩線 | 1979 | 84.9      | 5          | PC2径間連続T桁橋    | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 1,032    |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 49  | 多摩センター大橋西脇橋   | 多摩市道5-33号歩線 | 1979 | 84.9      | 5          | PC2径間連続T桁橋    | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 1,032    |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 50  | 多摩センター大橋西側橋   | 多摩市道5-34号歩線 | 1980 | 29.5      | 6.5        | PC単純中空床版橋     | 2017 | III |              | 0      | 補修/点検        | 伸縮装置 取替工 | 30,466        |          | 0             |          | 0             |           | 0      |
| 51  | ゆうゆう橋         | 多摩市道5-31号歩線 | 1980 | 93.2      | 15         | 3径間連続PC箱桁橋    | 2017 | II  | 補修           | 舗装打換工  | 60,770       | 点検       | 3,399         |          | 0             |          | 0             |           | 0      |
| 52  | 多摩郵便局東道路橋     | 多摩市道6-2号幹線  | 1980 | 71        | 25         | 3径間連続PC箱桁橋    | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 4,315    |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 53  | レンガ坂橋         | 多摩市道5-35号歩線 | 1981 | 36.5      | 11         | PC門型ラ-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 976      |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 54  | バルテノン中央橋      | 多摩市道5-33号歩線 | 1981 | 38        | 20         | PC門型ラ-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 1,848    |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 55  | バルテノン東脇橋      | 多摩市道5-33号歩線 | 1981 | 38        | 5          | PC門型ラ-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 462      |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 56  | バルテノン西脇橋      | 多摩市道5-33号歩線 | 1981 | 38        | 5          | PC門型ラ-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 462      |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 57  | 白山橋           | 多摩市道5-31号歩線 | 1983 | 36.5      | 8          | PC門型ラ-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 点検           | 710      |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |
| 58  | 多1・3・6-1号橋    | 多摩市道5-31号歩線 | 1980 | 36.5      | 12         | PC門型ラ-メ橋      | 2017 | II  |              | 0      | 設計/点検        | 5,493    |               | 0        | 補修            | 伸縮装置 取替工 | 44,280        |           | 0      |
| 59  | 豊ヶ丘北公園南側ベテ橋   | 多摩市道5-17号歩線 | 1982 | 22        | 5.8        | PC単純中空床版橋     | 2021 | I   | 点検           | 625    |              | 0        |               | 0        |               | 0        |               | 0         |        |

表 6-8. 短期計画事業一覧 (5/6)

| No. | 橋梁名          | 路線名         | 架設年  | 橋長<br>(m) | 全幅員<br>(m) | 構造形式         | 点検結果 |     | 2026 (R8) 年度 |          | 2027 (R9) 年度 |        | 2028 (R10) 年度 |          | 2029 (R11) 年度 |          | 2030 (R12) 年度 |        |
|-----|--------------|-------------|------|-----------|------------|--------------|------|-----|--------------|----------|--------------|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|
|     |              |             |      |           |            |              | 実施時期 | 健全性 | 301,762千円    |          | 280,444千円    |        | 261,134千円     |          | 251,916千円     |          | 247,323千円     |        |
|     |              |             |      |           |            |              |      |     | 主な対策内容       | 費用(千円)   | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容        | 費用(千円)   | 主な対策内容        | 費用(千円)   | 主な対策内容        | 費用(千円) |
| 60  | きたとよ橋        | 多摩市道5-9号歩線  | 1978 | 31.5      | 4.6        | PC単純和-スラ橋    | 2021 | I   | 点検           | 710      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 61  | 213号橋        | 多摩市道5-2号歩線  | 1982 | 24        | 5.8        | PC単純中空床版橋    | 2021 | I   | 点検           | 682      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 62  | 211号線道路橋     | 多摩市道5-60号線  | 1983 | 16        | 7.2        | RC-メBOX橋     | 2021 | I   | 点検           | 565      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 63  | バブルコニ橋       | 多摩市道5-6号歩線  | 1983 | 38        | 6          | PC3径間連続中空床版橋 | 2021 | II  | 補修/点検        | ひびわれ注入工  | 13,668       |        |               |          |               |          |               |        |
| 64  | とちのき橋        | 多摩市道5-9号歩線  | 1976 | 34.1      | 6.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋  | 2021 | I   | 点検           | 1,103    |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 65  | こぶし橋         | 多摩市道5-11号歩線 | 1978 | 37.1      | 4.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋  | 2021 | I   | 点検           | 836      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 66  | 白雲橋          | 多摩市道5-8号歩線  | 1978 | 36.6      | 4.6        | 鋼板桁方柱ラ-メ橋    | 2021 | II  | 点検           | 825      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 67  | 豊ヶ丘南公園東側ベテ橋  | 多摩市道5-23号歩線 | 1975 | 58.3      | 3.1        | PC3径間連続中空床版橋 | 2021 | I   | 点検           | 886      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 68  | 医者村橋         | 多摩市道5-14号歩線 | 1972 | 60.9      | 4.6        | PC単純桁橋       | 2021 | III | 点検           | 1,373    |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 69  | 貝取派出所脇ベテ橋    | 多摩市道5-11号歩線 | 1975 | 23.8      | 6.6        | PC門型ラ-メ橋     | 2021 | I   | 点検           | 770      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 70  | 卸売市場西側橋      | 多摩市道4-95号線  | 1979 | 58.1      | 15         | PC斜材付n型ラ-メ橋  | 2020 | II  |              | 0        |              |        |               |          |               |          | 点検            | 3,398  |
| 71  | 豊ヶ丘第6公園南側ベテ橋 | 多摩市道5-21号歩線 | 1975 | 37.2      | 3.1        | PC2径間連続中空床版橋 | 2021 | II  | 点検           | 565      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 72  | 202-E号橋      | 多摩市道5-11号歩線 | 1972 | 30.7      | 4.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋  | 2021 | I   | 点検           | 692      |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 73  | 南野スカイブリッジ    | 多摩市道5-22号歩線 | 1978 | 71.3      | 4.6        | PC3径間連続中空床版橋 | 2021 | I   | 点検           | 1,608    |              |        |               |          |               |          |               |        |
| 74  | ふんすい橋        | 多摩市道5-14号歩線 | 1976 | 55.3      | 5.6        | PC単純桁橋       | 2021 | III | 補修/点検        | 断面修復工    | 31,518       |        |               |          |               |          |               |        |
| 75  | 落合第一歩道橋      | 多摩市道5-24号歩線 | 1973 | 17.9      | 5.7        | PC単純中空床版橋    | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 248    |               |          |               |          |               |        |
| 76  | 落合第二歩道橋      | 多摩市道5-26号歩線 | 1973 | 27.7      | 5.7        | PC単純中空床版橋    | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 384    |               |          |               |          |               |        |
| 77  | 落合南公園東側ベテ橋   | 多摩市道5-27号歩線 | 1973 | 17.9      | 5.7        | PC単純中空床版橋    | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 248    |               |          |               |          |               |        |
| 78  | 落合第四歩道橋      | 多摩市道5-26号歩線 | 1973 | 27.7      | 5.7        | PC単純中空床版橋    | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 384    |               |          |               |          |               |        |
| 79  | 一本杉橋         | 多摩市道5-26号歩線 | 1981 | 84.9      | 6.6        | PC2径間非対称斜張橋  | 2017 | III |              | 0        | 点検           | 1,362  |               |          |               |          |               |        |
| 80  | 恐竜橋          | 多摩市道5-28号歩線 | 1981 | 25.6      | 5.7        | PC単純中空スラ橋    | 2017 | II  | 補修           | 伸縮装置 取替工 | 9,190        | 点検     | 355           |          |               |          |               |        |
| 81  | 311号橋        | 多摩市道5-40号歩線 | 1978 | 25.2      | 6.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋  | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 404    |               |          |               |          |               |        |
| 82  | 風の橋          | 多摩市道5-28号歩線 | 1978 | 65.6      | 7.6        | PC有ヒンジラ-メ橋   | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 1,212  |               |          |               |          |               |        |
| 83  | るんるん橋        | 多摩市道5-11号歩線 | 1982 | 34        | 6.8        | PCレール式ラ-メ橋   | 2017 | II  |              | 0        | 補修/点検        | 断面修復工  | 6,692         |          |               |          |               |        |
| 84  | るんるん橋西側ベテ橋   | 多摩市道5-11号歩線 | 1978 | 34.1      | 6.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋  | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 547    |               |          |               |          |               |        |
| 85  | 宝野橋          | 多摩市道5-38号歩線 | 1981 | 34.5      | 4.8        | PC単純中空床版橋    | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 403    |               |          |               |          |               |        |
| 86  | 落合第5公園西側ベテ橋  | 多摩市道5-38号歩線 | 1982 | 29.5      | 4.8        | RC3径間連続中空床版橋 | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 344    |               |          |               |          |               |        |
| 87  | にしおち橋        | 多摩市道5-11号歩線 | 1982 | 31        | 4.8        | PCレール式ラ-メ橋   | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 362    |               |          |               |          |               |        |
| 88  | いちょう橋        | 多摩市道5-35号歩線 | 1978 | 64        | 7.6        | PC有ヒンジラ-メ橋   | 2017 | II  |              | 0        | 設計/点検        | 21,182 |               |          | 耐震            | 落橋防止用設置工 | 117,072       |        |
| 89  | 307-1号橋      | 多摩市道5-11号歩線 | 1981 | 30        | 8.8        | PC門型ラ-メ橋     | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 642    |               |          |               |          |               |        |
| 90  | ゆたか橋         | 多摩市道5-22号歩線 | 1975 | 29.7      | 4.6        | PC3径間連続中空床版橋 | 2021 | II  | 点検           | 670      | 設計           | 342    |               |          |               | 補修       | ひびわれ注入工       | 3,420  |
| 91  | 稲荷橋          | 多摩市道6-8号線   | 1975 | 12.1      | 20.8       | PC単純桁橋       | 2018 | III |              | 0        | 点検           | 834    |               |          | 設計            |          | 5,621         |        |
| 92  | 稲荷橋南側京王線鉄道脇橋 | 多摩市道6-12号線  | 1981 | 26        | 7.2        | PC単純桁橋       | 2018 | II  | 補修           | 断面修復工    | 11,630       | 点検     | 620           |          |               |          |               |        |
| 93  | めぐみの橋        | 多摩市道6-2号歩線  | 1981 | 31.4      | 6.5        | PC門型ラ-メ橋     | 2018 | III | 耐震           | 落橋防止用設置工 | 80,000       | 点検     | 676           |          |               |          |               |        |
| 94  | はなみずき橋西側ベテ橋  | 多摩市道6-5号歩線  | 1978 | 34        | 6.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋  | 2018 | II  |              | 0        | 点検           | 744    |               |          |               |          |               |        |
| 95  | はなみずき橋       | 多摩市道6-6号歩線  | 1978 | 37        | 6.6        | PC斜材付n型ラ-メ橋  | 2018 | II  | 補修           | 舗装打換工    | 12,220       | 点検     | 809           |          |               |          |               |        |
| 96  | 鶴牧第1公園北側ベテ橋  | 多摩市道6-7号歩線  | 1978 | 25.6      | 6.6        | RC斜材付n型ラ-メ橋  | 2018 | II  |              | 0        | 点検           | 560    |               |          |               |          | 設計            | 1,223  |
| 97  | 鶴乃橋          | 多摩市道6-9号歩線  | 1983 | 87        | 5.3        | PC有ヒンジラ-メ橋   | 2018 | II  |              | 0        | 点検           | 1,528  |               |          |               |          |               |        |
| 98  | 唐木田駅前道路橋     | 多摩市道6-5号幹線  | 1989 | 42.7      | 18         | PCホルトンション橋   | 2017 | II  |              | 0        | 点検           | 2,547  |               |          | 設計            |          | 1,640         |        |
| 99  | 唐木田駅前広場橋     | 多摩市道6-5号幹線  | 1989 | 35.3      | 35.5       | PC単純桁橋       | 2017 | II  |              | 0        | 設計/点検        | 6,813  |               |          |               | 補修       | 舗装打換工         | 26,600 |
| 100 | 剣橋           | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 47.5      | 7.1        | PC単純中空床版ラ-メ橋 | 2018 | II  |              | 0        | 点検           | 1,118  |               |          |               |          |               |        |
| 101 | 元気橋          | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 25        | 4.8        | PC単純中空床版橋    | 2018 | II  |              | 0        | 補修           | 断面修復工  | 8,040         | 点検       | 398           |          |               |        |
| 102 | ひじり中央橋       | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 30        | 6.8        | PC単純中空床版橋    | 2018 | II  |              | 0        | 補修           | 断面修復工  | 12,500        | 点検       | 676           |          |               |        |
| 103 | 聖ヶ丘橋         | 多摩市道3-198号線 | 1980 | 80        | 10.4       | 鋼下路式ラ-メ橋     | 2018 | III |              | 0        | 点検           | 2,757  |               |          |               |          |               |        |
| 104 | おもいで橋        | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 30        | 5.8        | PC単純中空床版橋    | 2018 | II  | 設計           | 910      |              | 0      | 補修/点検         | 舗装打換工    | 9,677         |          |               |        |
| 105 | ふたて橋         | 多摩市道3-7号歩線  | 1984 | 74.9      | 4.8        | PC単純中空床版橋    | 2018 | II  |              | 0        | 点検           | 1,192  |               |          |               |          |               |        |
| 106 | 船形橋          | 多摩市道3-1号歩線  | 1983 | 22        | 4.8        | PC単純中空床版橋    | 2018 | II  | 設計           | 858      |              | 0      | 補修/点検         | 舗装打換工    | 8,930         |          |               |        |
| 107 | 大谷戸公園南側ベテ橋   | 多摩市道3-1号歩線  | 1987 | 30        | 4.8        | PC単純中空床版橋    | 2018 | II  |              | 0        | 補修           | 舗装打換工  | 6,900         | 点検       | 477           |          |               |        |
| 108 | 愛宕第一歩道橋      | 多摩市道2-5号歩線他 | 1971 | 33.5      | 2.9        | 鋼床版I式門型ラ-メ橋  | 2019 | II  |              | 0        |              | 0      | 点検            |          | 454           | 設計       |               | 373    |
| 109 | 切通し橋         | 多摩市道6-2号歩線  | 1970 | 19        | 3          | PC中空床版ラ-メ橋   | 2019 | II  | 設計           | 974      |              | 0      | 補修            | 伸縮装置 取替工 | 9,740         | 点検       |               | 266    |
| 110 | 健康センター南側BOX橋 | 多摩市道1-88号線  | 1986 | 2         | 17.8       | RC-BOX橋      | 2019 | II  |              | 0        | 設計           | 276    |               |          | 0             | 補修/点検    | 断面修復工         | 2,926  |
| 111 | 九頭龍公園南側BOX橋  | 多摩市道1-80号線  | 1986 | 2.8       | 5          | RC-BOX橋      | 2019 | I   |              | 0        |              | 0      |               |          | 0             | 点検       |               | 65     |
| 112 | 一宮団地西側水路橋    | 多摩市道1-126号線 | 1963 | 2.5       | 8.6        | RCコックト床版単純橋  | 2019 | I   |              | 0        |              | 0      |               |          | 0             | 点検       |               | 100    |
| 113 | 体育館南側水路橋     | 多摩市道2-83号線  | 1963 | 2.6       | 1.9        | RC床版桁橋       | 2019 | III |              | 0        |              | 0      |               |          | 0             | 点検       |               | 23     |
| 114 | 2号水路1号BOX橋   | 多摩市道4-3号線   | 1971 | 5.5       | 15.7       | RC-BOX橋      | 2020 | I   |              | 0        |              | 0      |               |          | 0             | 点検       |               | 337    |
| 115 | 2号水路2号BOX橋   | 多摩市道4-5号線   | 1975 | 5.5       | 6.7        | RC-BOX橋      | 2020 | I   |              | 0        |              | 0      |               |          | 0             | 点検       |               | 144    |
| 116 | 2号水路3号BOX橋   | 多摩市道4-6号線   | 1971 | 5.5       | 6.7        | RC-BOX橋      | 2020 | I   |              | 0        |              | 0      |               |          | 0             | 点検       |               | 144    |
| 117 | 2号水路4号BOX橋   | 多摩市道4-8号線   | 1975 | 5.5       | 6.8        | RC床版桁橋       | 2020 | I   |              | 0        |              | 0      |               |          | 0             | 点検       |               | 146    |
| 118 | 3号水路1号BOX橋   | 多摩市道4-12号線  | 1991 | 12.3      | 7.2        | RC-BOX橋      | 2020 | I   |              | 0        |              | 0      |               |          | 0             | 点検       |               | 345    |

表 6-9. 短期計画事業一覧 (6/6)

| No. | 橋梁名             | 路線名         | 架設年  | 橋長 (m) | 全幅員 (m) | 構造形式              | 点検結果 |     | 2026 (R8) 年度 |             | 2027 (R9) 年度 |        | 2028 (R10) 年度 |        | 2029 (R11) 年度 |        | 2030 (R12) 年度 |        |
|-----|-----------------|-------------|------|--------|---------|-------------------|------|-----|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|     |                 |             |      |        |         |                   | 実施時期 | 健全性 | 301,762千円    |             | 280,444千円    |        | 261,134千円     |        | 251,916千円     |        | 247,323千円     |        |
|     |                 |             |      |        |         |                   |      |     | 主な対策内容       | 費用(千円)      | 主な対策内容       | 費用(千円) | 主な対策内容        | 費用(千円) | 主な対策内容        | 費用(千円) | 主な対策内容        | 費用(千円) |
| 119 | 4号水路1号BOX橋      | 多摩市道5-8号線   | 1992 | 6.2    | 11.6    | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 353         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 120 | 4号水路2号BOX橋      | 多摩市道5-12号線  | 1992 | 8.7    | 6.1     | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 260         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 121 | 4号水路3号BOX橋      | 多摩市道5-45号線  | 1992 | 7.9    | 6.6     | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 256         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 122 | 4号水路4号BOX橋      | 多摩市道5-53号線  | 1978 | 5.8    | 6.6     | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 188         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 123 | 4号水路5号BOX橋      | 多摩市道5-56号線  | 1978 | 5.6    | 6.6     | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 181         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 124 | 4号水路6号BOX橋      | 多摩市道5-60号線  | 1992 | 5.3    | 12.6    | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 327         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 125 | 4号水路7号BOX橋      | 多摩市道5-55号線  | 1981 | 5      | 6.6     | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 162         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 126 | 5号水路1号BOX橋      | 多摩市道5-22号線  | 1978 | 6.6    | 18.6    | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 602         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 127 | 5号水路2号BOX橋      | 多摩市道5-34号線  | 1979 | 7.8    | 6.6     | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 252         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 128 | 5号水路3号BOX橋      | 多摩市道5-79号線  | 1990 | 9.6    | 6.6     | RC-BOX橋           | 2021 | I   | 点検           | 311         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 129 | 7号水路1号BOX橋      | 多摩市道6-17号線  | 1976 | 6.8    | 9.2     | RC-BOX橋           | 2018 | III |              | 0           |              | 点検     | 207           |        |               |        |               |        |
| 130 | 7号水路2号BOX橋      | 多摩市道6-27号線  | 1976 | 7.6    | 9.5     | RC-BOX橋           | 2018 | III |              | 0           |              | 点検     | 239           |        |               |        |               |        |
| 131 | 7号水路3号BOX橋      | 多摩市道6-2号幹線  | 1976 | 7      | 20.6    | RC-BOX橋           | 2018 | III |              | 0           |              | 点検     | 478           |        |               |        |               |        |
| 132 | 7号水路4号BOX橋      | 多摩市道6-127号線 | 1976 | 7      | 6.6     | RC-BOX橋           | 2018 | III |              | 0           |              | 点検     | 153           |        |               |        |               |        |
| 133 | 7号水路5号BOX橋      | 多摩市道6-124号線 | 1977 | 7.1    | 6.6     | RC-BOX橋           | 2018 | III |              | 0           |              | 点検     | 155           |        |               |        |               |        |
| 134 | 7号水路6号BOX橋      | 多摩市道6-122号線 | 1977 | 6.2    | 6.6     | RC-BOX橋           | 2018 | III |              | 0           |              | 点検     | 136           |        |               |        |               |        |
| 135 | 大貝戸小橋           | 多摩市道5-5号線   | 1993 | 22.9   | 3.8     | PC単純中空床版橋         | 2021 | I   | 点検           | 427         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 136 | 119号橋           | 多摩市道4-28号歩線 | 1982 | 25.4   | 4.8     | PC単純中空床版橋         | 2020 | II  | 設計           | 1,054       |              | 補修     | 伸縮装置 取替工      | 10,540 |               | 点検     | 475           |        |
| 137 | 鶴牧中東側ベテ橋        | 多摩市道6-4号歩線  | 1983 | 28.5   | 4.8     | RC3径間連続中空床版橋      | 2018 | II  |              | 0           | 設計           | 660    | 点検            | 453    | 補修            | 舗装打換工  | 6,600         |        |
| 138 | 南鶴牧小西側ベテ橋       | 多摩市道6-4号歩線  | 1977 | 46.5   | 6.6     | RC斜材付n型ラーメン橋      | 2018 | II  |              | 0           |              | 点検     | 1,017         |        |               |        |               |        |
| 139 | 貝取第5公園東側ベテ橋     | 多摩市道4-27号歩線 | 1977 | 50     | 4.6     | PC3径間連続中空床版橋      | 2020 | II  | 耐震           | 落橋防止システム設置工 | 50,000       |        |               |        |               | 点検     | 897           |        |
| 140 | 永山小橋            | 多摩市道4-11号線  | 1988 | 26.3   | 3.2     | PC単純T桁橋           | 2020 | I   |              | 0           |              |        |               |        |               | 点検     | 328           |        |
| 141 | センター総合レジャーベテ橋   | 多摩市道5-33号歩線 | 1994 | 21.2   | 6.4     | PC単純中空床版橋         | 2017 | II  |              | 0           | 点検           | 330    |               |        |               |        |               |        |
| 142 | 多摩センター西側ベテ橋     | 多摩市道6-2号歩線  | 1994 | 75.6   | 4.8     | 3径間連続鋼床版箱桁橋       | 2017 | II  |              | 0           | 点検           | 882    |               |        |               |        |               |        |
| 143 | であい橋            | 多摩市道5-17号線  | 1994 | 22     | 8.8     | PC単純中空床版橋         | 2021 | I   | 点検           | 949         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 144 | 大橋              | 多摩市道5-154号線 | 1972 | 27.4   | 10.8    | 活荷重単純合成鋼桁橋        | 2021 | I   | 点検           | 1,450       |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 145 | 鶴牧西公園西側ベテ橋      | 多摩市道6-12号歩線 | 1990 | 43.2   | 3.8     | RC斜材付n型ラーメン橋      | 2018 | III |              | 0           |              | 点検     | 544           |        |               |        |               |        |
| 146 | 多広路1-1橋         | 多摩市道5-13号歩線 | 1981 | 85     | 4.8     | PC片持固定橋           | 2021 | I   | 点検           | 2,000       |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 147 | 報恩橋             | 多摩市道3-76号線  | 1974 | 55.8   | 5.3     | n°スパンPC単純T桁橋      | 2019 | I   |              | 0           |              |        | 点検            | 1,381  |               |        |               |        |
| 148 | 鶴牧西公園南側ベテ橋      | 多摩市道6-4号歩線  | 1980 | 30.6   | 4.8     | RC3径間連続中空床版橋      | 2018 | II  |              | 0           |              | 点検     | 487           |        |               |        |               |        |
| 149 | 多2・1・11-2号橋     | 多摩市道6-3号歩線  | 1980 | 50     | 6.5     | PC3径間連続鋼床版橋       | 2018 | II  |              | 0           |              | 点検     | 1,077         | 設計     | 2,634         |        |               |        |
| 150 | 鶴牧東公園北側ベテ橋      | 多摩市道6-13号歩線 | 1982 | 34.4   | 6.8     | RC3径間連続中空床版橋      | 2018 | II  | 設計           | 544         | 点検           | 775    | 補修            | 断面修復工  | 5,440         |        |               |        |
| 151 | 318-2号橋         | 多摩市道5-29号歩線 | 1983 | 26.5   | 4.5     | PC門型ラーメン橋         | 2017 | II  |              | 0           | 点検           | 290    |               |        |               |        |               |        |
| 152 | 中和田橋            | 多摩市道2-93号線  | 1998 | 37.4   | 3.8     | n°スパンPC単純T桁橋      | 2019 | I   |              | 0           |              |        | 点検            | 664    |               |        |               |        |
| 153 | 211号橋           | 多摩市道5-45号歩線 | 1982 | 24     | 5.8     | PC単純中空床版橋         | 2021 | I   | 点検           | 682         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 154 | プリータブリッジ        | 多摩市道1-1号歩線  | 1999 | 35.1   | 8       | 立体ラーメン式鋼床版箱桁橋     | 2019 | I   |              | 0           |              |        | 点検            | 1,311  |               |        |               |        |
| 155 | モノレール連絡橋        | 多摩市道6-2号歩線  | 1999 | 5.7    | 8       | I桁歩道橋             | 2018 | I   | 設計           | 20,000      |              | 耐震/点検  | 落橋防止システム設置工   | 37,851 |               |        |               |        |
| 156 | E-1デッキ          | 多摩市道5-48号歩線 | 2003 | 182.6  | 4.9     | RC連続桁橋            | 2017 | III |              | 0           | 点検           | 2,175  |               |        |               |        |               |        |
| 157 | 多2・1・10-4橋      | 多摩市道5-32号歩線 | 1980 | 40     | 6.5     | PC中空床版斜n橋         | 2017 | II  |              | 0           | 点検           | 632    |               |        |               |        |               |        |
| 158 | 多1・3・6-2号橋      | 多摩市道5-48号歩線 | 1988 | 38.6   | 4.5     | PC単純箱桁橋           | 2017 | II  |              | 0           | 点検           | 422    |               |        |               |        |               |        |
| 159 | 318-1号橋         | 多摩市道5-48号歩線 | 1983 | 26.5   | 4.5     | PC門型ラーメン橋         | 2017 | II  |              | 0           | 点検           | 290    |               |        |               |        |               |        |
| 160 | 多1・3・5-3号橋      | 多摩市道5-31号歩線 | 1981 | 36.5   | 11      | PC門型ラーメン橋         | 2018 | II  |              | 0           | 点検           | 1,331  |               |        |               |        |               |        |
| 161 | 多1・3・3-1号橋      | 多摩市道5-36号歩線 | 1980 | 96     | 7.8     | PC3径間連続桁橋(中央有トンナ) | 2017 | II  |              | 0           | 点検           | 1,820  |               |        |               |        |               |        |
| 162 | 307-2号橋         | 多摩市道6-10号歩線 | 1981 | 22     | 7       | PC中空床版橋           | 2018 | II  |              | 0           |              | 設計/点検  | 972           | 補修     | 断面修復工         | 4,620  |               |        |
| 163 | 308号橋           | 多摩市道5-36号歩線 | 2004 | 22.2   | 6.8     | RCn°-ラーメン橋        | 2018 | II  |              | 0           |              | 設計/点検  | 904           | 補修     | ひびわれ注入工       | 4,040  |               |        |
| 164 | K209号橋          | 多摩市道5-50号歩線 | 1982 | 15.6   | 15      | RC単純中空床版桁橋        | 2021 | I   | 点検           | 1,147       |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 165 | K216号橋          | 多摩市道5-50号歩線 | 1983 | 15.3   | 4.8     | RC単純中空床版桁橋        | 2021 | II  | 点検           | 360         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 166 | 大貝戸橋            | 多摩市道2-5号幹線  | 1969 | 12     | 16.8    | PC単純I桁橋           | 2019 | III |              | 0           |              |        | 点検            | 941    |               |        |               |        |
| 167 | 下落合橋            | 多摩市道5-37号線  | 2007 | 15.6   | 3.3     | n°スパンPC床版桁橋       | 2017 | I   | 点検           | 125         |              |        |               |        |               |        |               |        |
| 168 | 永山ハイソ歩道橋        | 多摩市道4-22号歩線 | 1977 | 55.5   | 4.6     | PC単純床版桁橋          | 2020 | II  |              | 0           |              |        |               | 設計/点検  | 2,831         |        |               |        |
| 169 | 永山駅北口歩道橋        | 多摩市道4-4号幹線  | 1994 | 58.7   | 3.4     | PC単純床版桁橋          | 2020 | I   |              | 0           |              |        |               | 点検     | 778           |        |               |        |
| 170 | 唐木田駅前自転車駐輪場橋    | 多摩市道6-5号幹線  | 1989 | 46.4   | 11.5    | 単純鋼床版I桁橋          | 2017 | I   |              | 0           | 点検           | 1,768  |               |        |               |        |               |        |
| 171 | 多摩センター駅東自転車駐輪場橋 | 多摩市道5-86号線  | 1980 | 29.1   | 3       | PC単純床版桁橋          | 2017 | III |              | 0           | 点検           | 212    |               |        |               |        |               |        |
| 172 | 1-49-1橋         | 多摩市道1-49号線  | 1963 | 2      | 6       | RC-BOX橋           |      |     |              | 0           |              |        | 点検            | 35     |               |        |               |        |
| 173 | 1-56-1橋         | 多摩市道1-56号線  | 1963 | 2.5    | 6.3     | RC-BOX橋           |      |     |              | 0           |              |        | 点検            | 74     |               |        |               |        |
| 174 | 3-232-1橋        | 多摩市道3-232号線 | 1963 | 8      | 5.5     | RC床版桁橋            |      |     |              | 0           |              |        | 点検            | 170    |               |        |               |        |
| 175 | 3-73-1橋         | 多摩市道3-73号線  | 1963 | 2.2    | 4.5     | RC-BOX橋           |      |     |              | 0           |              |        | 点検            | 64     |               |        |               |        |
| 176 | 3-49-1橋         | 多摩市道3-49号線  | 1963 | 2.3    | 6       | RC-BOX橋           |      |     |              | 0           |              |        | 点検            | 120    |               |        |               |        |
